

COMUNE DI RIVARA

PROVINCIA DI TORINO

**PROGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE
DELL'OROLOGIO**

PROPRIETA': COMUNE DI RIVARA
Corso Ogliani n. 9 - 10080 Rivara (TO)

Timbro e Firma _____

PROGETTISTA: ARCH. LEONE LIVIO
Via San Martino n°3 - 10086 Rivarolo C.se (TO)
Tel. e Fax 0124/26554
e-mail: info@studioarchitetturaleone.it
pec livio.leone@architettitorinopec.it



Timbro e Firma _____

TAVOLA N	OGGETTO	CRONOPROGRAMMA
MARZO 2014		

Comune di Rivara

Provincia di Torino

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: Restauro conservativo della Torre dell'Orologio


COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Rivara


Rivarolo Canavese, 20/03/2014

Il Tecnico
(Arch. Livio Leone)

Livio Leone architetto
Via San Martino, 3 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)

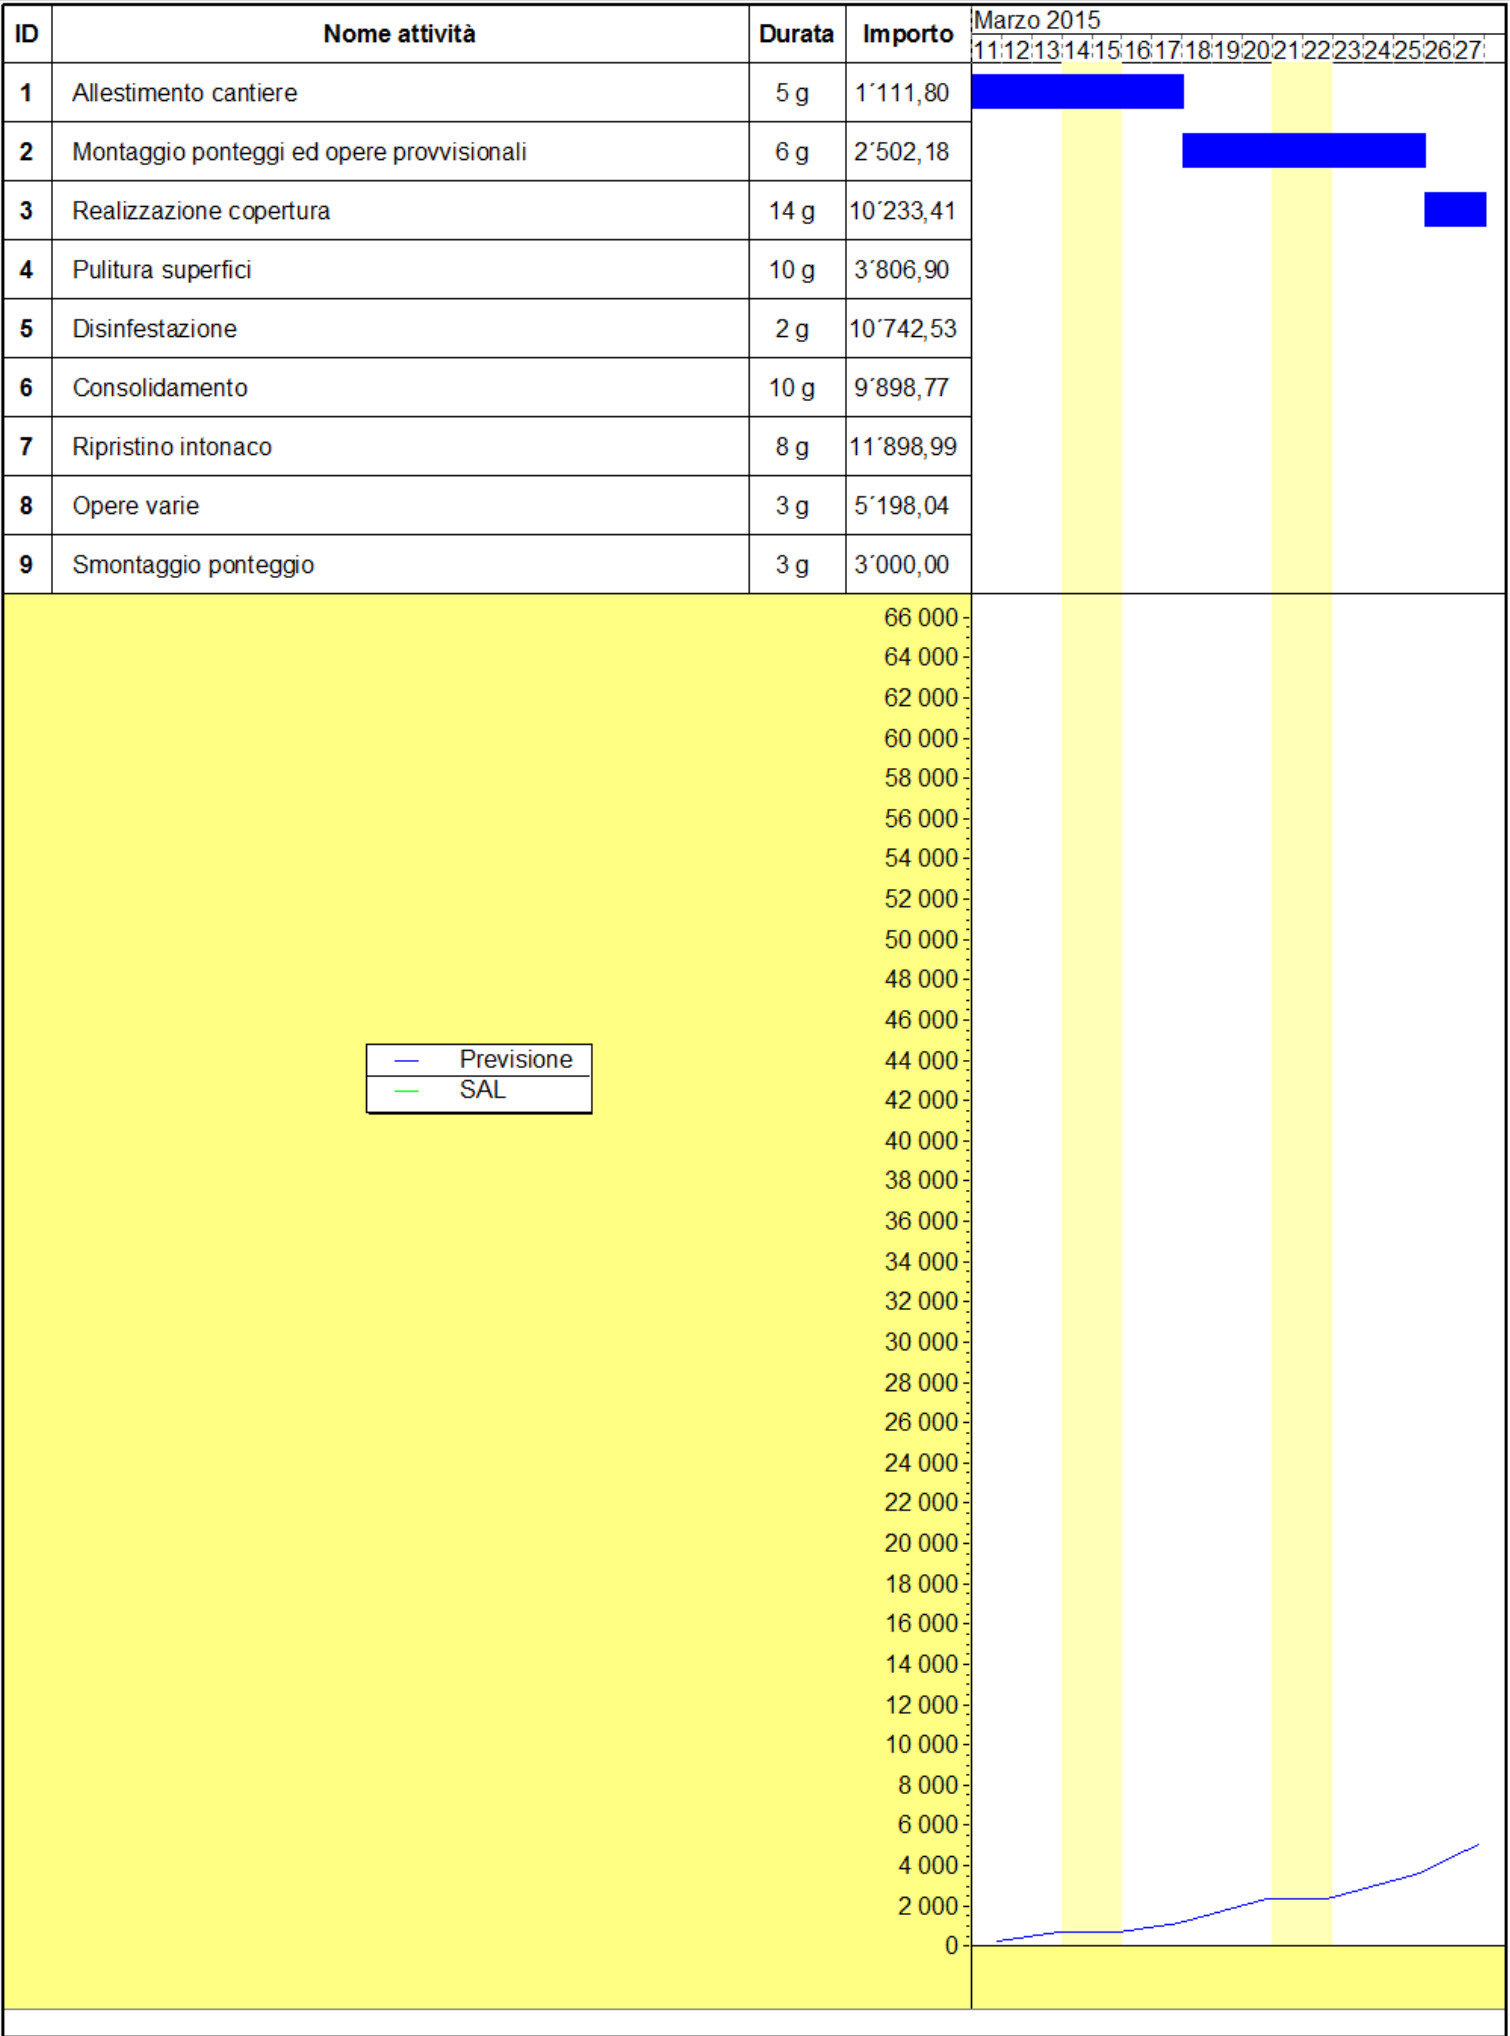

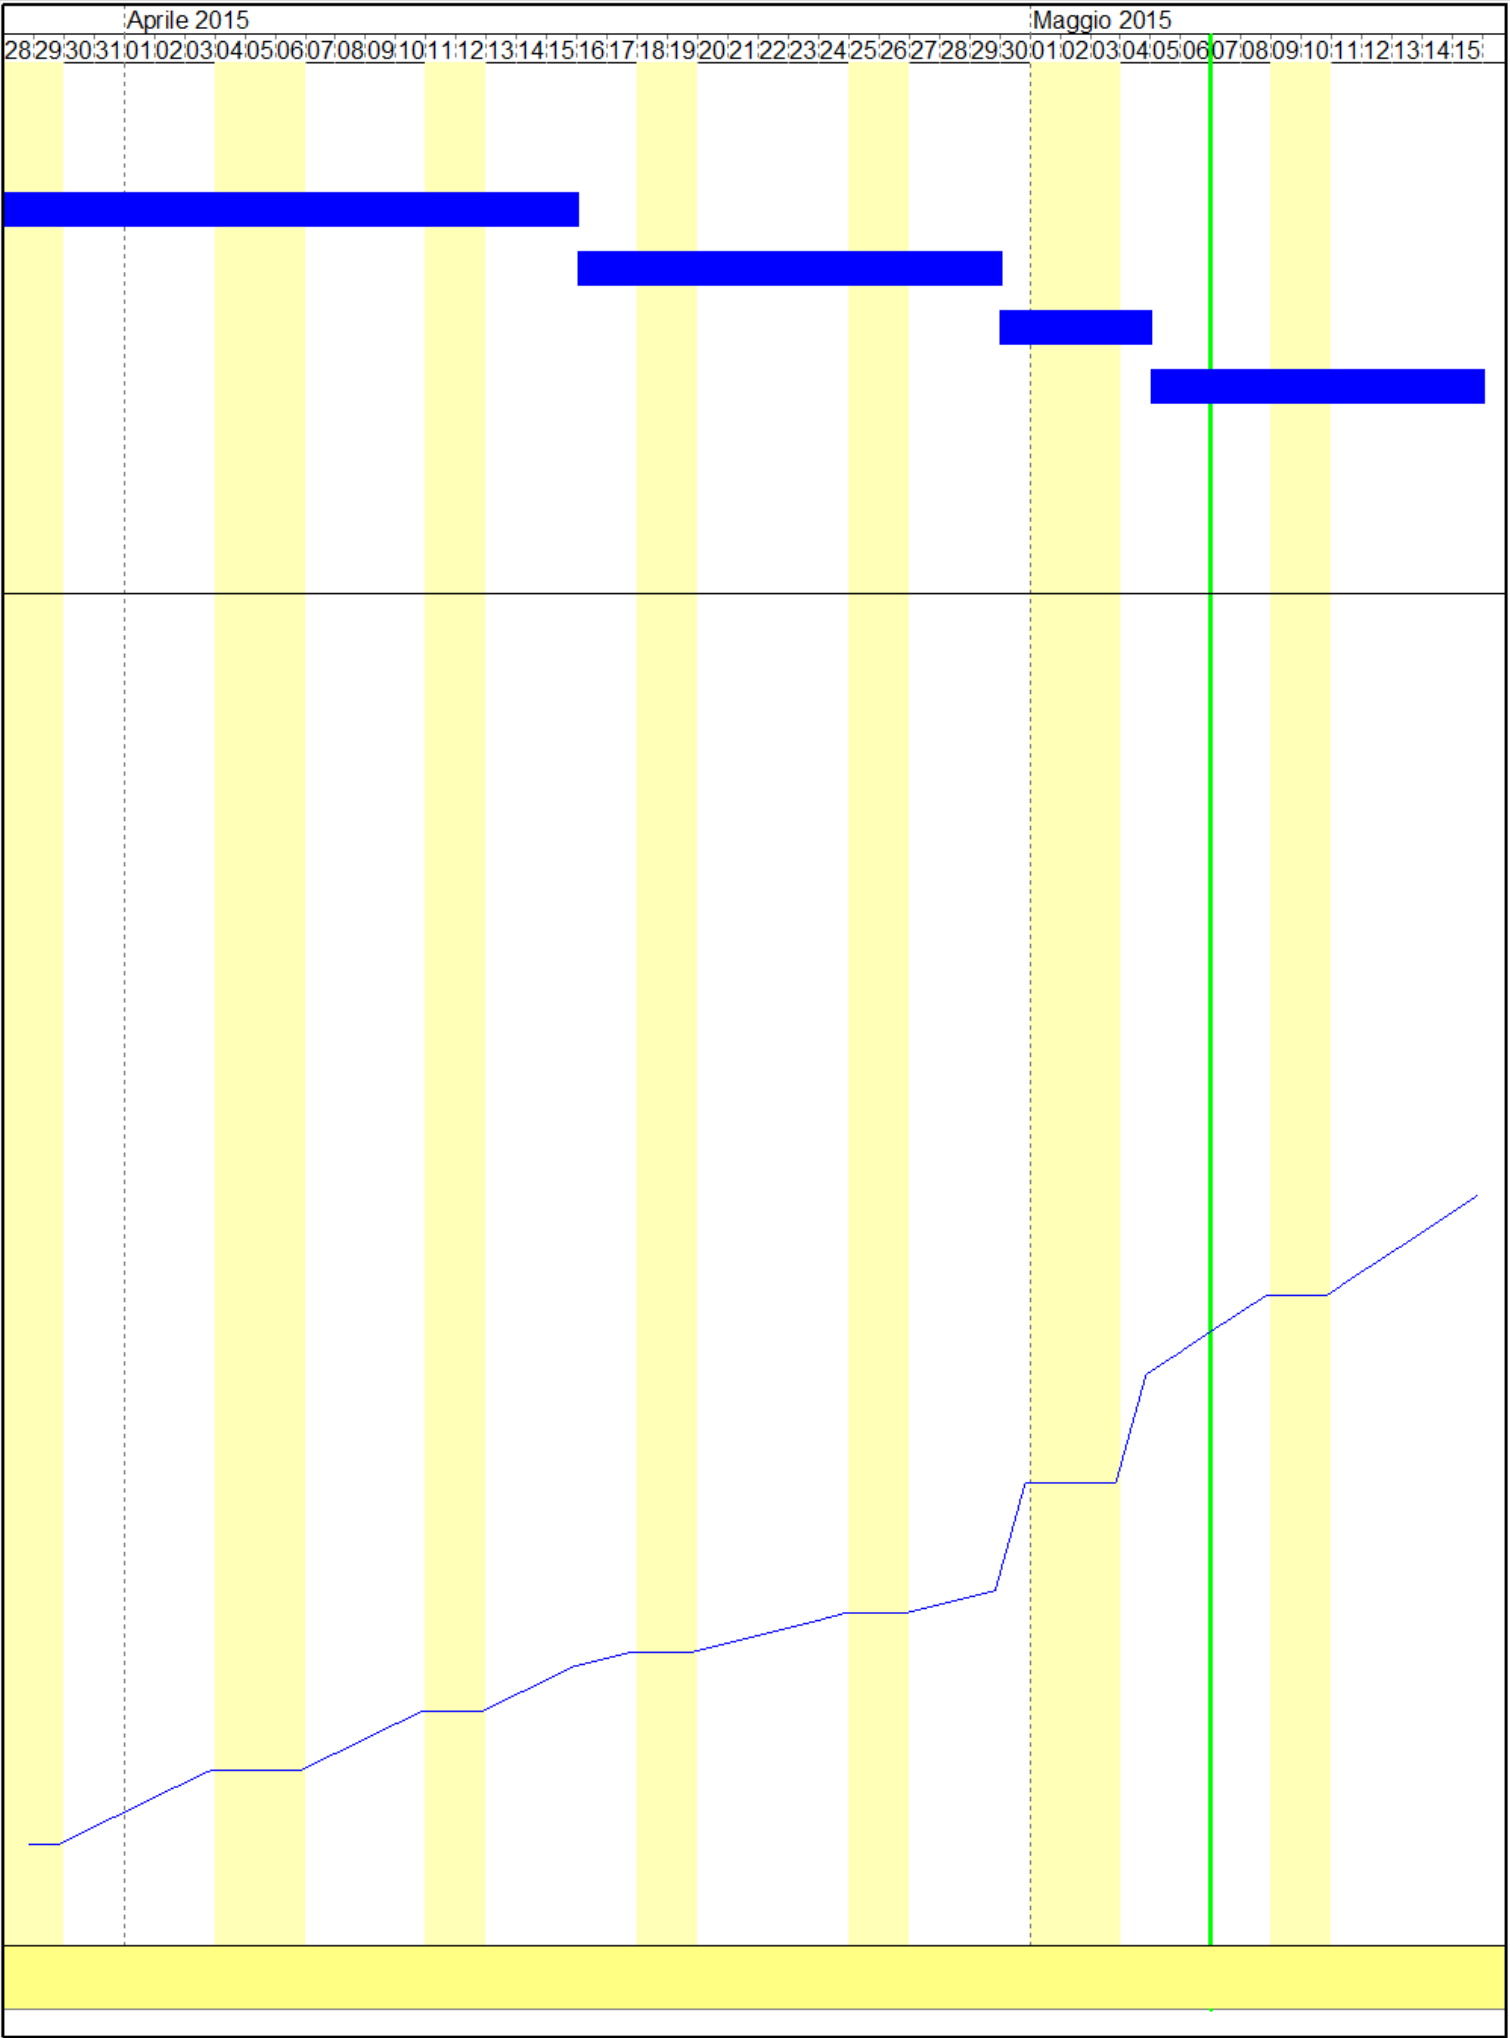

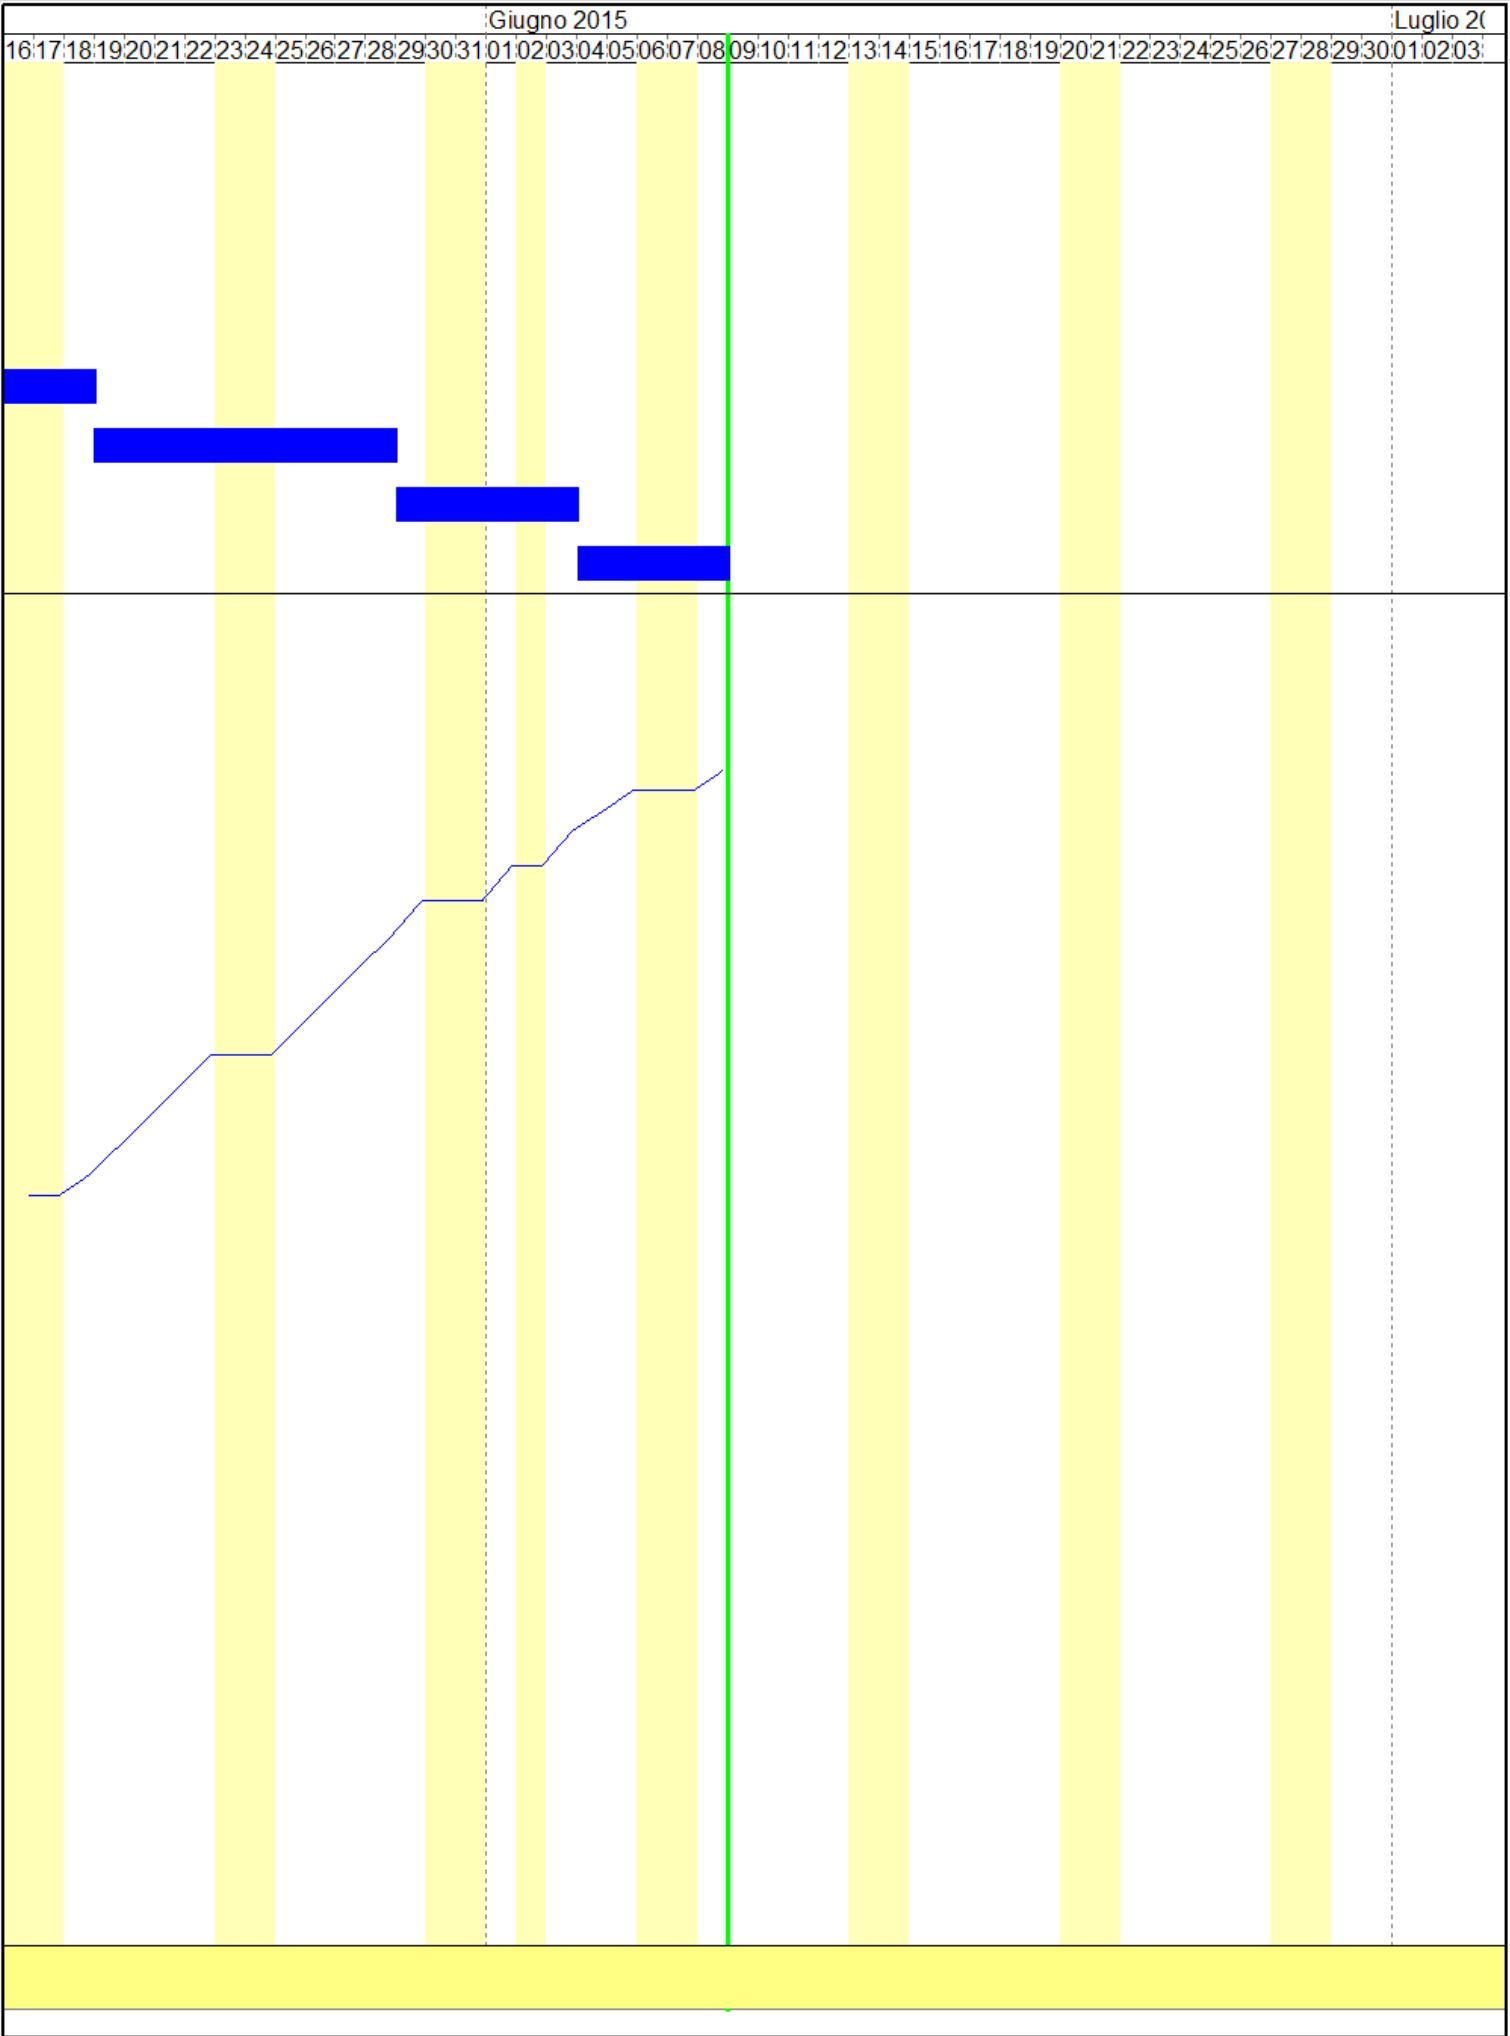

Comune di Rivara

Provincia di Torino

Tabella Attività

OGGETTO: Restauro conservativo della Torre dell'Orologio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Rivara

Rivarolo Canavese, 20/03/2014

Il Tecnico
(Arch. Livio Leone)

Livio Leone architetto
Via San Martino, 3 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento cantiere	1'111,80	1,90	11/03/2015	17/03/2015	5	7
Montaggio ponteggi ed opere provvisionali	2'502,18	4,29	18/03/2015	25/03/2015	6	8
Realizzazione copertura	10'233,41	17,53	26/03/2015	15/04/2015	14	21
Pulitura superfici	3'806,90	6,52	16/04/2015	29/04/2015	10	14
Disinfestazione	10'742,53	18,40	30/04/2015	04/05/2015	2	5
Consolidamento	9'898,77	16,95	05/05/2015	18/05/2015	10	14
Ripristino intonaco	11'898,99	20,38	19/05/2015	28/05/2015	8	10
Opere varie	5'198,04	8,90	29/05/2015	03/06/2015	3	6
Smontaggio ponteggio	3'000,00	5,14	04/06/2015	08/06/2015	3	5
Rivarolo Canavese, 20/03/2014						
Tecnico Arch. Livio Leone						

Comune di Rivara

Provincia di Torino

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Restauro conservativo della Torre dell'Orologio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Rivara

Rivarolo Canavese, 20/03/2014

Il Tecnico
(Arch. Livio Leone)

Livio Leone architetto
Via San Martino, 3 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
11/03/2015	222,36	222,36	0,38
12/03/2015	222,36	444,72	0,76
13/03/2015	222,36	667,08	1,14
16/03/2015	222,36	889,44	1,52
17/03/2015	222,36	1'111,80	1,90
18/03/2015	417,03	1'528,83	2,62
19/03/2015	417,03	1'945,86	3,33
20/03/2015	417,03	2'362,89	4,05
23/03/2015	417,03	2'779,92	4,76
24/03/2015	417,03	3'196,95	5,47
25/03/2015	417,03	3'613,98	6,19
26/03/2015	730,96	4'344,94	7,44
27/03/2015	730,96	5'075,90	8,69
30/03/2015	730,96	5'806,85	9,94
31/03/2015	730,96	6'537,81	11,20
01/04/2015	730,96	7'268,77	12,45
02/04/2015	730,96	7'999,73	13,70
03/04/2015	730,96	8'730,69	14,95
07/04/2015	730,96	9'461,64	16,20
08/04/2015	730,96	10'192,60	17,46
09/04/2015	730,96	10'923,56	18,71
10/04/2015	730,96	11'654,52	19,96
13/04/2015	730,96	12'385,47	21,21
14/04/2015	730,96	13'116,43	22,46
15/04/2015	730,96	13'847,39	23,71
16/04/2015	380,69	14'228,08	24,37
17/04/2015	380,69	14'608,77	25,02
20/04/2015	380,69	14'989,46	25,67
21/04/2015	380,69	15'370,15	26,32
22/04/2015	380,69	15'750,84	26,97
23/04/2015	380,69	16'131,53	27,63
24/04/2015	380,69	16'512,22	28,28
27/04/2015	380,69	16'892,91	28,93
28/04/2015	380,69	17'273,60	29,58
29/04/2015	380,69	17'654,29	30,23
30/04/2015	5'371,27	23'025,56	39,43
04/05/2015	5'371,27	28'396,83	48,63
05/05/2015	989,88	29'386,70	50,33
06/05/2015	989,88	30'376,58	52,02
07/05/2015	989,88	31'366,46	53,72
08/05/2015	989,88	32'356,34	55,41
11/05/2015	989,88	33'346,21	57,11
12/05/2015	989,88	34'336,09	58,80
13/05/2015	989,88	35'325,97	60,50
14/05/2015	989,88	36'315,84	62,19
15/05/2015	989,88	37'305,72	63,89
18/05/2015	989,88	38'295,60	65,58
19/05/2015	1'487,37	39'782,97	68,13
20/05/2015	1'487,37	41'270,35	70,68
21/05/2015	1'487,37	42'757,72	73,22
22/05/2015	1'487,37	44'245,10	75,77
25/05/2015	1'487,37	45'732,47	78,32
26/05/2015	1'487,37	47'219,84	80,87
27/05/2015	1'487,37	48'707,22	83,41
28/05/2015	1'487,37	50'194,59	85,96
29/05/2015	1'732,68	51'927,27	88,93
01/06/2015	1'732,68	53'659,95	91,90
03/06/2015	1'732,68	55'392,63	94,86
04/06/2015	1'000,00	56'392,63	96,57
05/06/2015	1'000,00	57'392,63	98,29
08/06/2015	1'000,00	58'392,63	100,00
Rivarolo Canavese, 20/03/2014			

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
Tecnico Arch. Livio Leone			
